

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	4,500백만원
				사업기간	2021 ~ 2023
사업유형	<input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	추진율	10%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	인조잔디 구장 3개소 건립				

목 표	인조, 천연잔디구장 1읍면 1개소 이상 설치
현 황	14개 읍·면 중 11개 읍·면 축구장 조성 완료
추진율 산정기준	3개면 인조잔디 구장 건립 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 장산면, 신의면, 암태면
- 사 업 량 : 인조잔디 구장 1식 (1,200백만원 × 3개소)
- 총사업비 : 3,600백만원(국고 1,080, 군비 2,520)
- 사업내용 : 인조잔디구장 설치

추진상황

- 2022년 운동장생활체육시설 지원 사업 균특 예산 요구
- 장산면 사업부지 토지 매입 및 농지전용 협의 완료
- 장산면 사업부지 문화재 표본조사 완료

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
-	-	-	-	

연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4		• •	
	2/4			
	3/4			
	4/4			
2020	1/4		• •	
	2/4			
	3/4			
	4/4			
2021	1/4		• 국비 예산 신청 • 군비 예산 확보	10%
	2/4	국비 예산 신청		
	3/4	사업 기본계획 수립		
	4/4	사업 설계 용역 추진		
2022	1/4	사업 설계 용역 완료	• 국비 예산 확보 • 예산 집행 실적	33%
	2/4	사업추진 및 현장 점검		
	3/4	사업추진 및 현장 점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		

연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
인조잔디 축구장 조성	-	-	-	1개소	2개소	3개소

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	1,500	350	-	1,150	-	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	3,000	700	-	2,300	-	-	-	-	-	-
합계	4,500	1,050	-	3,450	-	-	-	-	-	-


문제점 및 대책

- 안정적인 재원 확보 어려움, 국비 확보를 통한 재원 마련 노력
- 사업부지 선정에 따른 토지매입 추진 필요
- 읍면별 1개소에서 권역별 1개소로 목표 완화 및 우선순위 조정
⇒ 장산면, 신의면 우선 조성

기대효과

- 생활체육 환경 조성 및 기반 시설 구축을 통해 주민의 쾌적한 생활 체육 여건을 마련하고 건전한 체육활동과 여가 생활 증진 도모
- 활발한 체육활동을 통한 지역주민의 건강증진 및 지역경제활성화 도모

관련사진

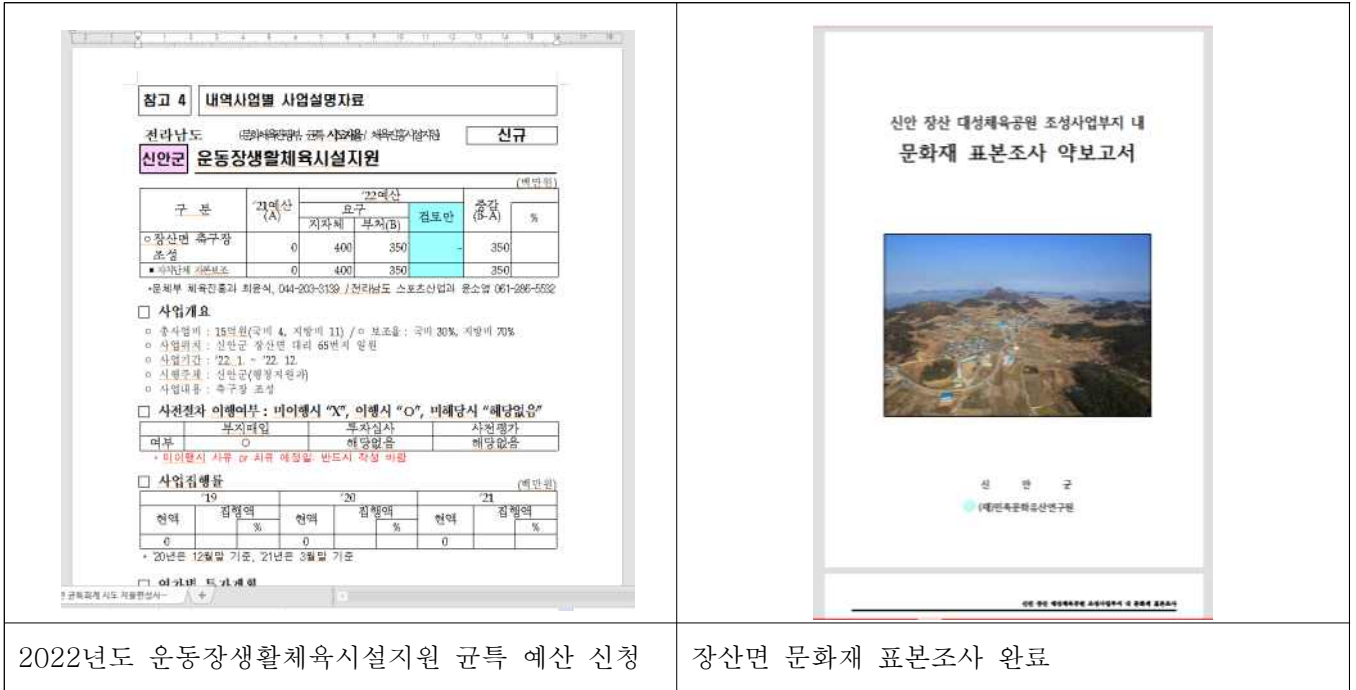

2022년도 운동장생활체육시설지원 균특 예산 신청

장산면 문화재 표본조사 완료

주관부서	행정지원과	연락처	☎ 061-240-8256
사업담당	행정지원과장 강정태	체육진흥담당 김형하	주무관 맹진석
